

TRONCONS de L'OUVRAGE

FORAGE D'EAU

Client: GAEC GUIGNARD

Maître d'oeuvre: GAEC GUIGNARD

Lieu de l'ouvrage :

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	0.15	Terre
0.15	5.00	Argile
5.00	35.00	Calaire argileux
35.00	50.00	Calaire

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	10.00	7"1/2	190.00	M.f.t.	Air
10.00	50.00	6"1/2	165.00	M.f.t.	Air

* Reconnaissance

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	35.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		
35.00	45.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Crepine fentes	1.00	
45.00	50.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Tube-decanteur		

REPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	20.00	4"7/8	125.00	Ciment	Cpa 55	Sous pression			

ACCESSOIRE

De	à	Type d'accessoire
20.00	20.00	Parapluie de cimentation

FORAGE D'EAU

Travaux réalisés :

1/1

du : 01/10/2023 au : 10/10/2023

Client :

GAEC GUIGNARD

Maitre d'oeuvre :

GAEC GUIGNARD

Localisation de l'ouvrage :

Coordonnées de l'ouvrage :

Lambert 1 carto métrique

Longitude (X):

0

Latitude (Y):

0


Altitude sol (Z):

+0,000 m

Echelle : 1/251

Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus)

Nombre de forages : 1

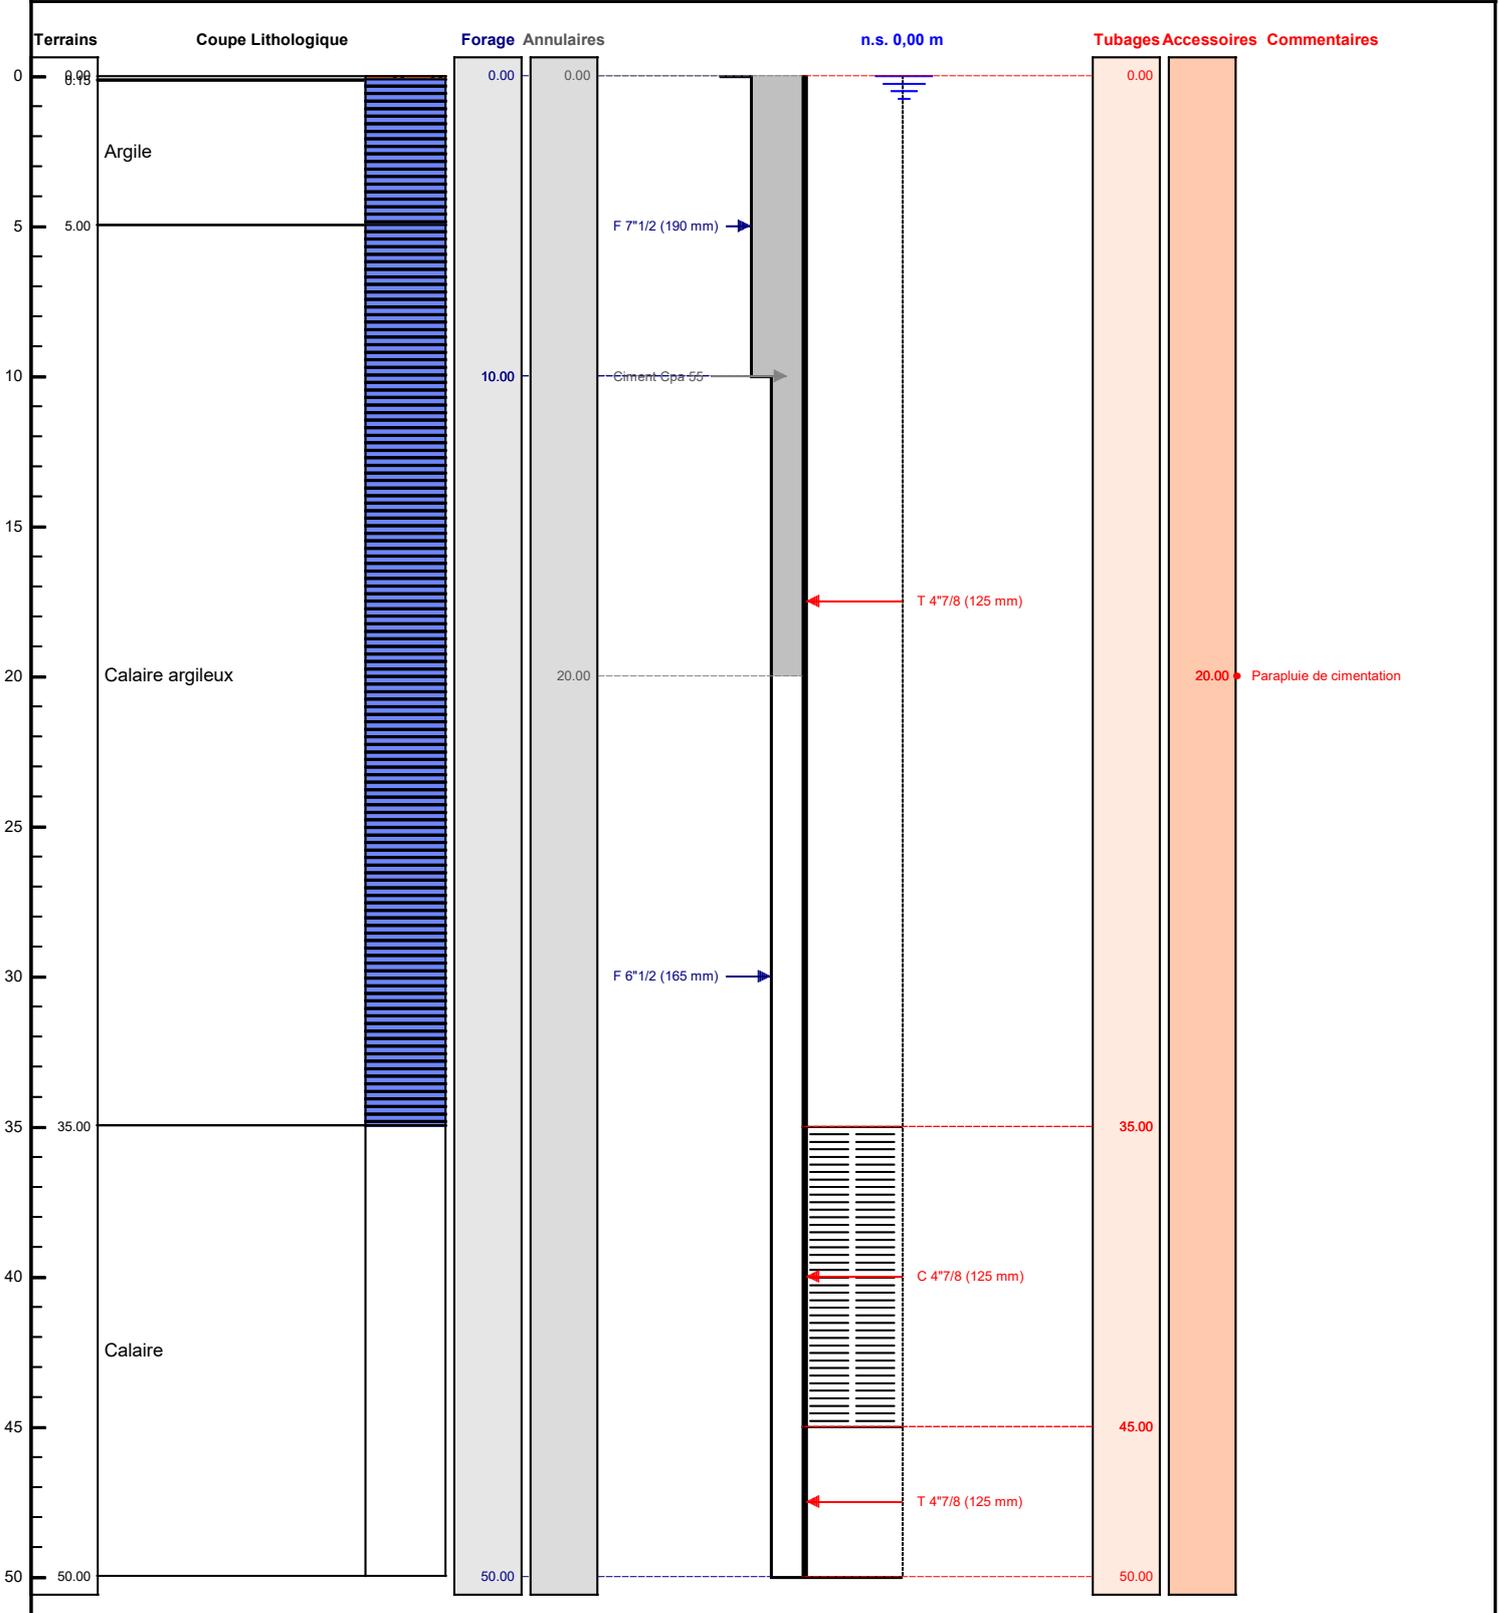

Le/...../..... à
 CERTIFIE CONFORME A L'OUVRAGE EXECUTE
 Tampon et signature du chef d'entreprise
