

flash INFO

RN19 déviation de Lure

N°5
septembre
2009

■ Édito

La journée de chantier ouvert au public du 14 juin vous a permis de venir découvrir l'avancement du chantier. Vous avez pu constater que les travaux de terrassements au niveau du mur de soutènement des Cloyes étaient achevés. Sur ce secteur, la prochaine étape consistera à réaliser les couches de chaussée afin de raccorder l'infrastructure à la route actuelle, ce qui conduira à partir du mois de septembre à quelques perturbations pour la circulation.

Ce flash d'information vous précise les modifications d'itinéraires sur le secteur des zones commerciales.

Joël PRILLARD
directeur régional de l'Équipement
de Franche-Comté



■ Retour sur le samedi 14 juin

Les agents de la DRE de Franche-Comté, de la DIR Est et de la mairie de Lure se sont mobilisés pour présenter à un public très intéressé les différentes phases du chantier.



contact

direction régionale
de l'Équipement
de Franche-Comté

service maîtrise
d'ouvrage

BP1169
25003 Besançon CEDEX

téléphone :
03 81 65 62 15

e-mail :
smo.dre-franche-comte
@developpement-durable.
gouv.fr


«La journée s'est déroulée dans la convivialité et les visiteurs, ont pu découvrir par bus le tracé de la future déviation RN19.»

Des modifications d'itinéraires

La réalisation des chaussées au niveau de la zones des Cloyes engendra à partir de septembre des modifications d'itinéraires. Cinq phases de travaux sont prévues sur une durée d'environ trois mois. Les deux premières phases obligeront les automobilistes à un détour par l'échangeur n°14 de la RD438 (Frotey les Lure). Pour les phases suivantes, le giratoire provisoire sera supprimé, seuls les mouvements de tourne à droite seront autorisés avant la mise en service définitive de la déviation.


> Confection de la bretelle de sortie et du terre-plein central sur OA

PHASE 1

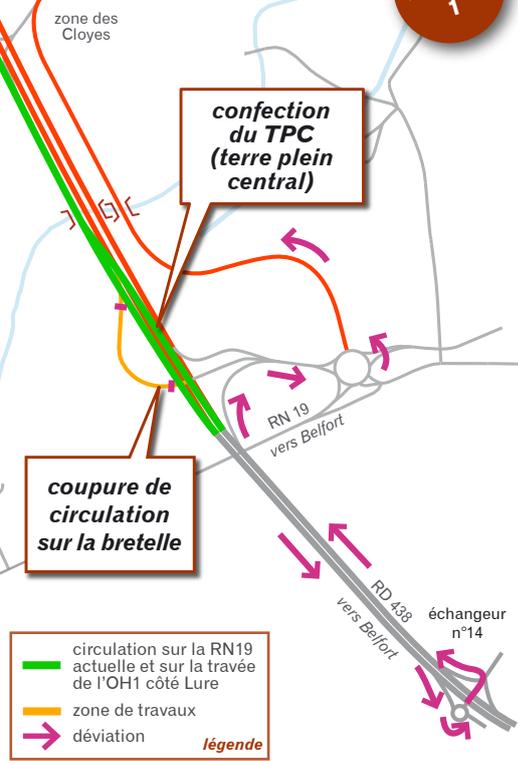


> Élargissement de la bretelle d'entrée et aire de convoi exceptionnel

PHASE 2

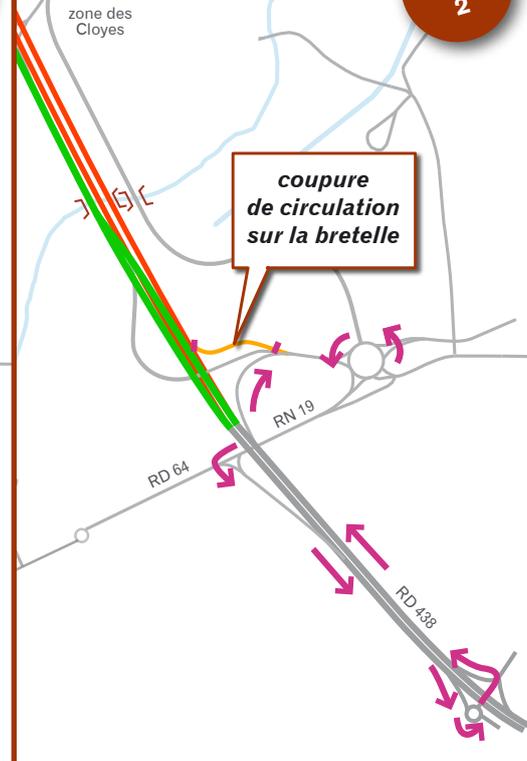


> confection de la voie sens Belfort/Vesoul

PHASE 3

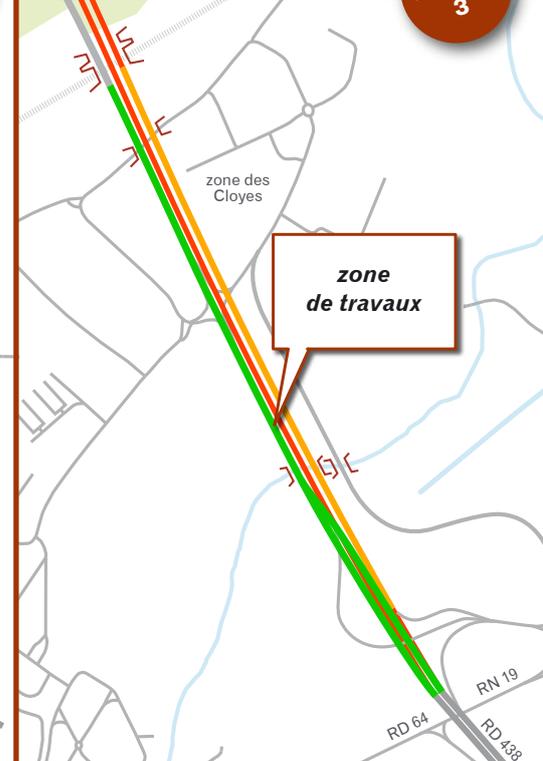


> Confection de la voie sens Vesoul/Belfort

PHASE 4

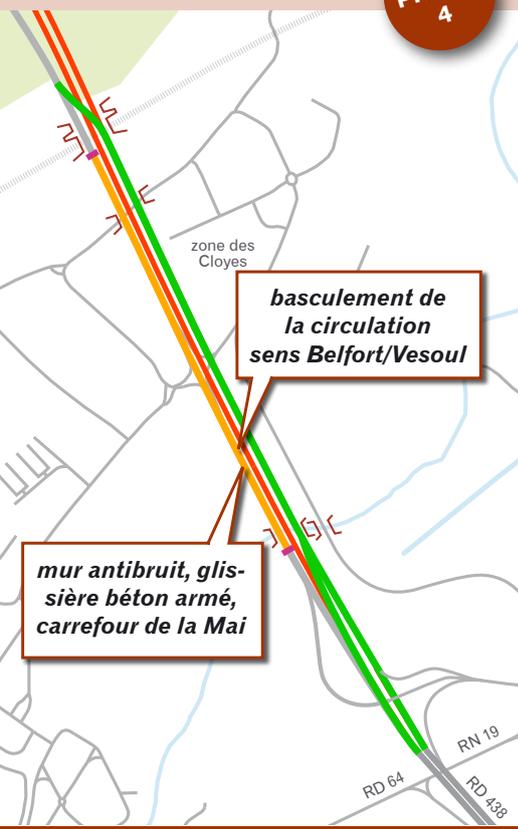

> Finition

PHASE 5

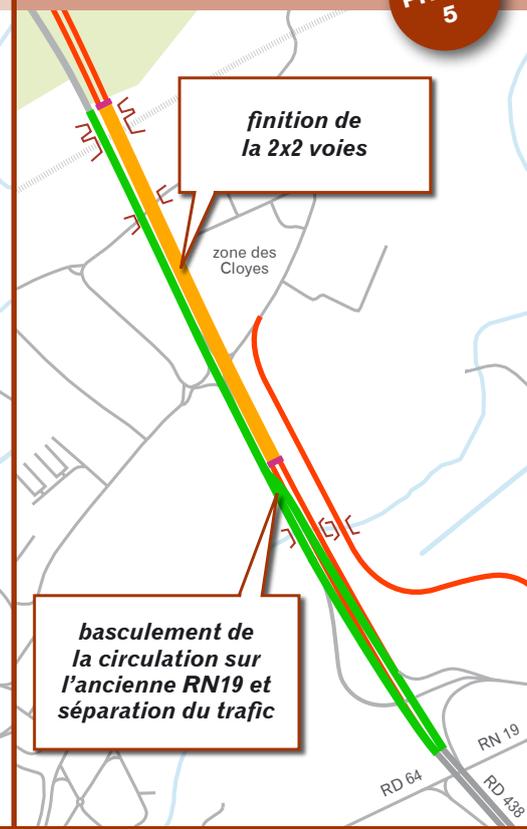

Calendrier

TRAVAUX	2006	2007	2008	2009	2010
déplacement des réseaux	■	■			
travaux préparatoires	■				
desserte ZA des Cloyes		■	■		
ouvrages d'art		■	■		
terrassement, assainissement				■	
chaussées et équipements				■	
aménagements paysagers, finitions				■	
mise en service					■

Cofinanceurs

