Construction centre aquatique intercommunal à Pontarlier - Planning APD

Début Mar 28/11/23 - Fin Mar 17/11/26
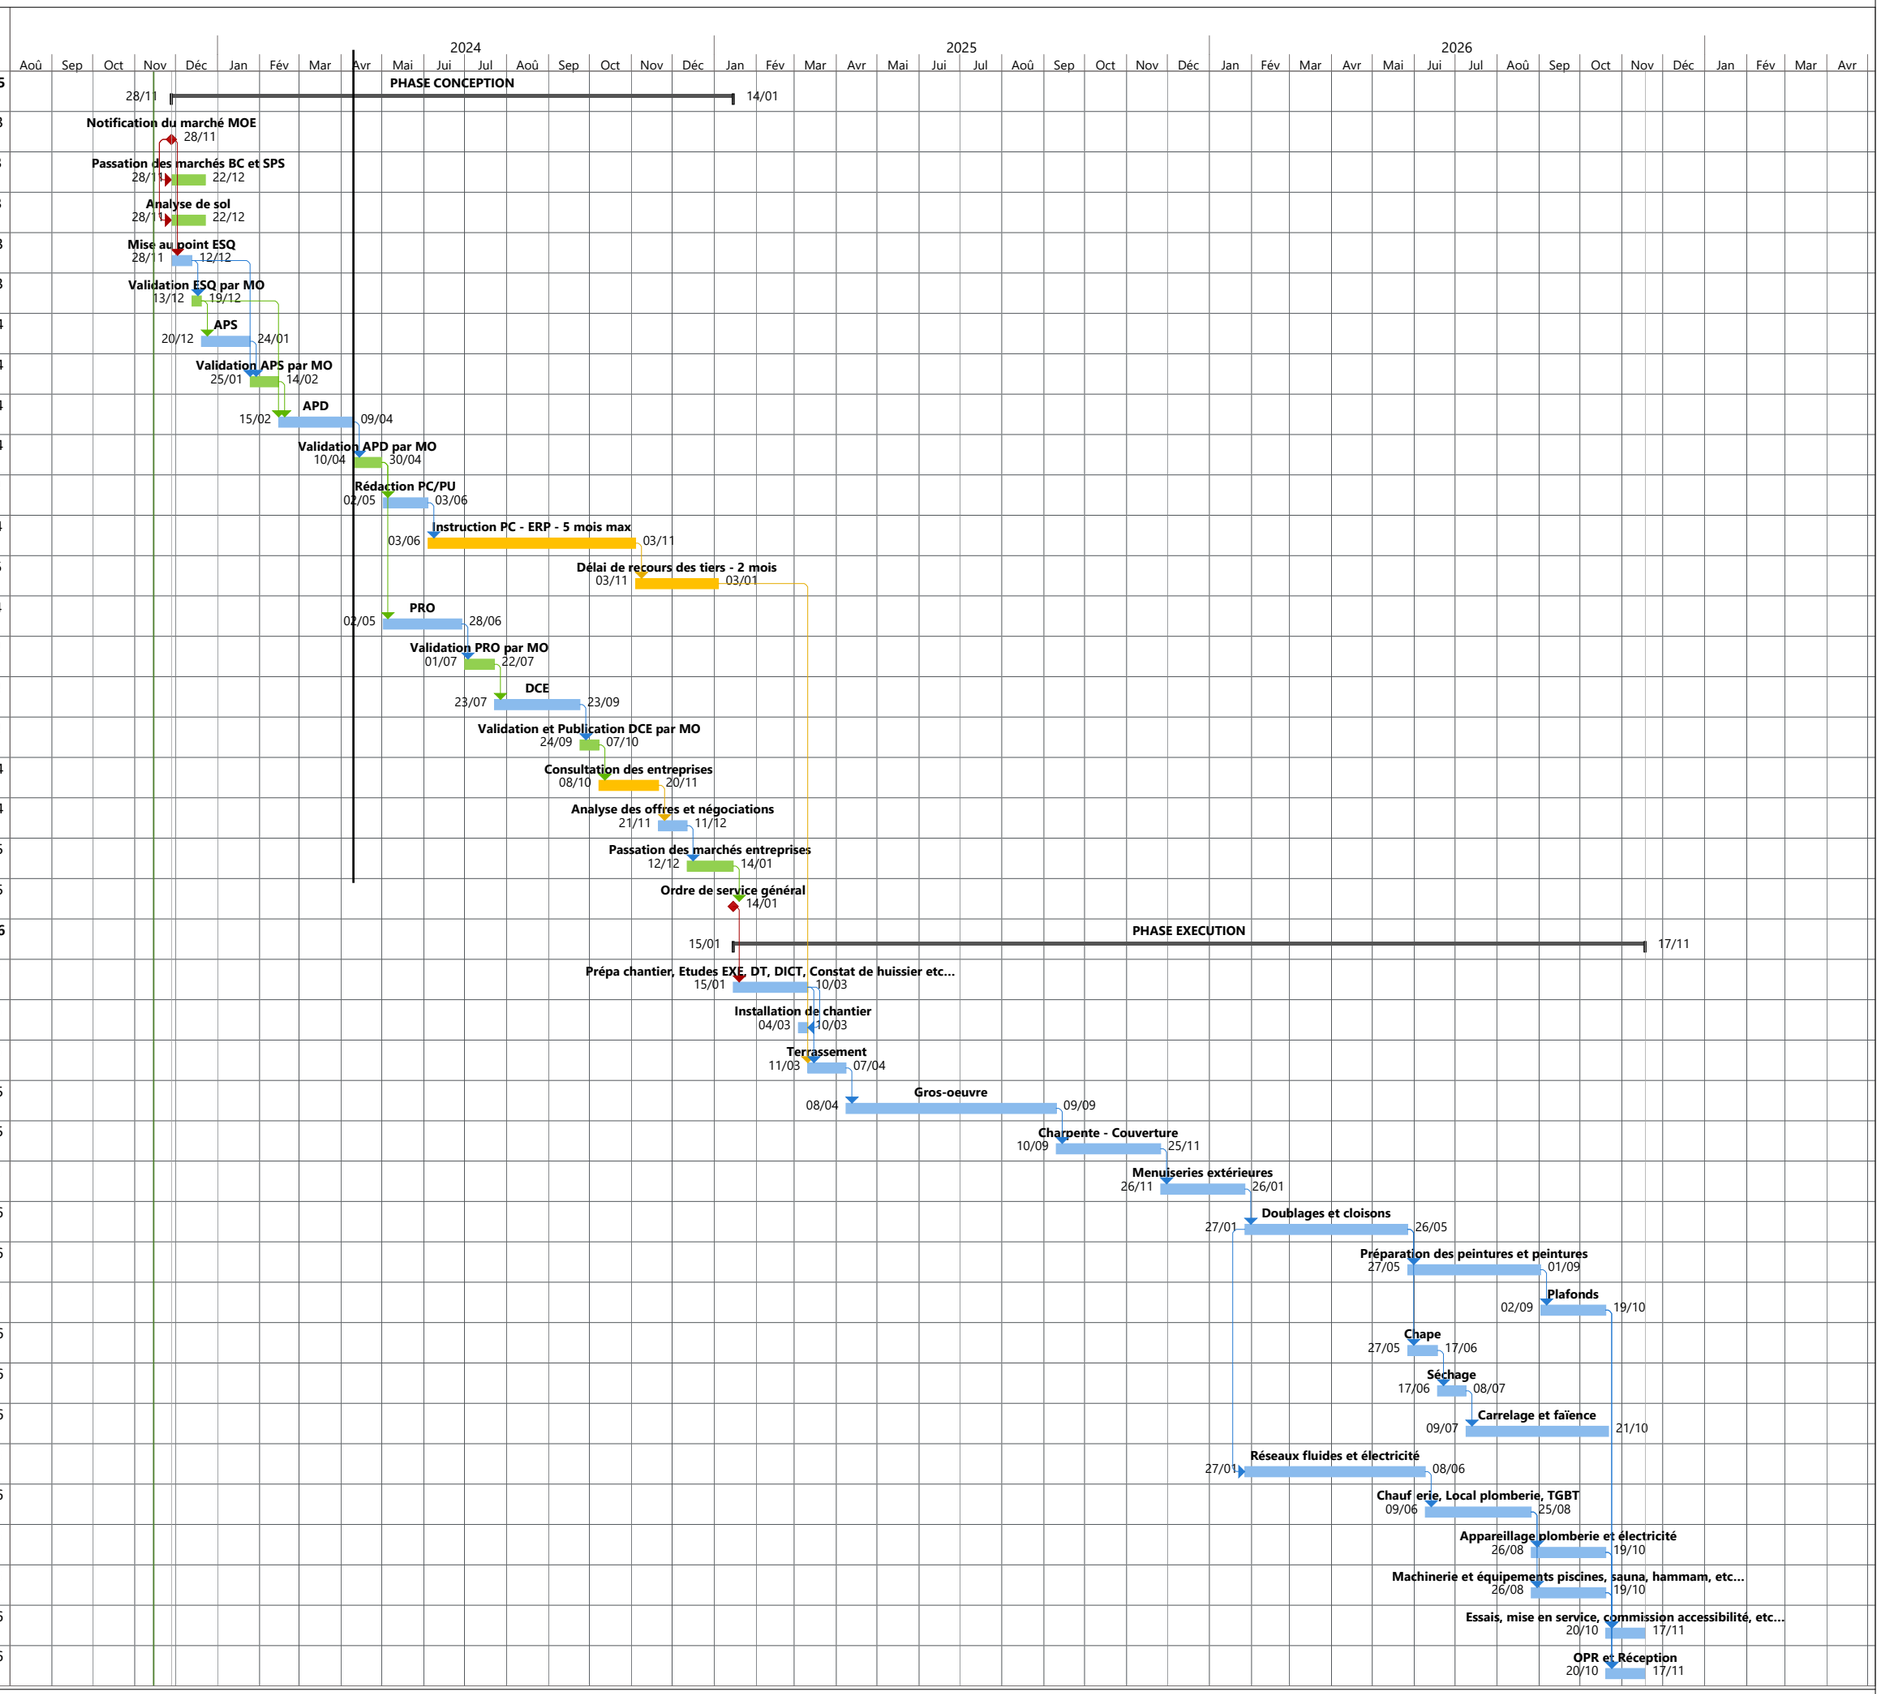
N°	Noms ressource	Tâche	Durée	Début	Fin
1		**PHASE CONCEPTION**	**256 jours**	**Mar 28/11/23**	**Mar 14/01/25**
2	MO	Notification du marché MOE	0 jour	Mar 28/11/23	Mar 28/11/23
3	MO	Passation des marchés BC et SPS	19 jours	Mar 28/11/23	Ven 22/12/23
4	MO	Analyse de sol	19 jours	Mar 28/11/23	Ven 22/12/23
5	MOE	Mise au point ESQ	11 jours	Mar 28/11/23	Mar 12/12/23
6	MO	Validation ESQ par MO	5 jours	Mer 13/12/23	Mar 19/12/23
7	MOE	APS	19 jours	Mer 20/12/23	Mer 24/01/24
8	MO	Validation APS par MO	15 jours	Jeu 25/01/24	Mer 14/02/24
9	MOE	APD	38 jours	Jeu 15/02/24	Mar 09/04/24
10	MO	Validation APD par MO	15 jours	Mer 10/04/24	Mar 30/04/24
11	MOE	Rédaction PC/PU	19 jours	Jeu 02/05/24	Lun 03/06/24
12		Instruction PC - ERP - 5 mois max	153 jourséc	Lun 03/06/24	Dim 03/11/24
13		Délai de recours des tiers - 2 mois	61 jourséc	Dim 03/11/24	Ven 03/01/25
14	MOE	PRO	38 jours	Jeu 02/05/24	Ven 28/06/24
15	MO	Validation PRO par MO	16 jours	Lun 01/07/24	Lun 22/07/24
16	MOE	DCE	30 jours	Mar 23/07/24	Lun 23/09/24
17	MO	Validation et Publication DCE par MO	10 jours	Mar 24/09/24	Lun 07/10/24
18		Consultation des entreprises	30 jours	Mar 08/10/24	Mer 20/11/24
19	MOE	Analyse des offres et négociations	15 jours	Jeu 21/11/24	Mer 11/12/24
20	MO	Passation des marchés entreprises	14 jours	Jeu 12/12/24	Mar 14/01/25
21	MOE	Ordre de service général	0 jour	Mar 14/01/25	Mar 14/01/25
22		**PHASE EXECUTION**	**424 jours**	**Mer 15/01/25**	**Mar 17/11/26**
23		Prépa chantier, Etudes EXE, DT, DICT, Constat de huissier etc...	39 jours	Mer 15/01/25	Lun 10/03/25
24		Installation de chantier	5 jours	Mar 04/03/25	Lun 10/03/25
25		Terrassement	20 jours	Mar 11/03/25	Lun 07/04/25
26		Gros-oeuvre	89 jours	Mar 08/04/25	Mar 09/09/25
27		Charpente - Couverture	54 jours	Mer 10/09/25	Mar 25/11/25
28		Menuiseries extérieures	34 jours	Mer 26/11/25	Lun 26/01/26
29		Doublages et cloisons	80 jours	Mar 27/01/26	Mar 26/05/26
30		Préparation des peintures et peintures	54 jours	Mer 27/05/26	Mar 01/09/26
31		Plafonds	34 jours	Mer 02/09/26	Lun 19/10/26
32		Chape	16 jours	Mer 27/05/26	Mer 17/06/26
33		Séchage	21 jourséc	Mer 17/06/26	Mer 08/07/26
34		Carrelage et faïence	59 jours	Jeu 09/07/26	Mer 21/10/26
35		Réseaux fluides et électricité	89 jours	Mar 27/01/26	Lun 08/06/26
36		Chaufferie, Local plomberie, TGBT	40 jours	Mar 09/06/26	Mar 25/08/26
37		Appareillage plomberie et électricité	39 jours	Mer 26/08/26	Lun 19/10/26
38		Machinerie et équipements piscines, sauna, hammam, etc...	39 jours	Mer 26/08/26	Lun 19/10/26
39		Essais, mise en service, commission accessibilité, etc...	20 jours	Mar 20/10/26	Mar 17/11/26
40		OPR et Réception	20 jours	Mar 20/10/26	Mar 17/11/26
